

MONTAGEPROTOKOLL

Nachträglicher Bewehrungsanschluss mit Injektionssystem VMU plus (ETA-11/0514)

Freie Felder müssen vollständig ausgefüllt und ☒ angekreuzt werden!

Montageanweisung oder ETA-11/0514 Anhang B sind zu beachten!

Dieses Protokoll ist zusammen mit den Lieferscheinen nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre aufzubewahren!

Montageprotokoll Nr.: _____

Datum: _____ / _____ / _____

Anschlussort _____ Bauteilposition _____

Plan Nr. _____ Position im Bewehrungsplan _____

Bauvorhaben:

Straße / Ort _____

Bauleitung _____ Tel.: _____ Fax: _____

Ausführende Firma:

Straße / Ort _____

Ansprechpartner _____ Tel.: _____ Fax: _____

Vorhandener Beton:

C _____ / _____ (B _____)

Vorhandene Bewehrung: ☐ Überprüfung der Lage

Stabdurchmesser _____ mm Achsabstand _____ mm

Einzubauende Bewehrung:

☐ B500B ☐ MKT Zuganker ZA ☐ _____

Anzahl der Stäbe: _____ Stück

Stabdurchmesser: $\varnothing$ = _____ mm


Betondeckung: c = _____ mm

Abstand (Bauteilrand – Stabachse): c_{bohr} = _____ mm

Bohrlochdurchmesser: d_0 = _____ mm

Setztiefe: l_v bzw. l_{ges} = _____ cm

Bohrrichtung: ☐ $\Rightarrow$ ☐ $\Downarrow$ ☐ $\Uparrow$ ☐ $\nearrow$ ☐ $\searrow$

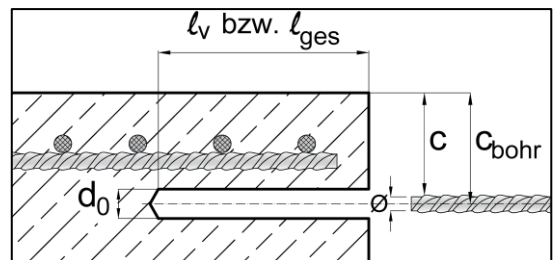

Bohrlocherstellung: ☐ Elektro-Bohrhammer ☐ Pressluft-Bohrhammer ☐ Saugbohrer

☐ Erstellung des Bohrlochs mit Bohrhilfe

Vorbereiten der Anschlussfuge: ☐ nach Vorgabe der Ausführungsplanung

Bohrlochreinigung bis zum Bohrlochgrund

Kompressortyp: _____ Leistung _____ m³/h _____ l/min

Bohrlochzustand: ☐ trocken ☐ feucht

☐ Ausblaspistole: ☐ VM-ABP 200 ☐ VM-ABP 250 ☐ VM-ABP 500 ☐ VM-ABP 1000

oder

☐ Druckluftsystem DLS mit und Schlauch RS _____

☐ 4x Ausblasen

☐ 4x Ausbürsten mit Reinigungsbürste RB _____ ☐ Min. Bürstendurchmesser beachtet

☐ 4x Ausblasen

Verfüllen der Bohrlöcher und Setzen der Bewehrungsstäbe:

VMU plus Kartuschen: ☐ 150 ml ☐ 280 ml ☐ 345 ml ☐ 410 ml ☐ 825 ml

Charge / Haltbarkeitsdatum: _____

☐ Statikmischer VM-X ☐ Mischerverlängerung VM-XE 10

☐ Statikmischer VM-XL ☐ Mischerverlängerung VM-XE 10 ☐ Mischerverlängerung VM-XLE 16

☐ Injektionsadapter VM-IA : _____ (Bohrloch- $\varnothing$)

MONTAGEPROTOKOLL

Nachträglicher Bewehrungsanschluss mit Injektionssystem VMU plus (ETA-11/0514)




Auspressgerät - Größe: ☐ VM-P 345 ☐ VM-P 380 ☐ VM-P 825
Auspressgerät - Typ: ☐ VM-P Standard ☐ VM-P Profi ☐ VM-P Akku ☐ VM-P Pneumatik

Temperatur: Luft: _____ °C Beton: _____ °C Kartusche: _____ °C Einbau: ____:____ Uhr

Zuganker ZA

Max. Installationsmoment T_{inst} :

☐ M12 - 50 Nm ☐ M20 - 150 Nm
☐ M16 - 100 Nm ☐ M24 - 150 Nm

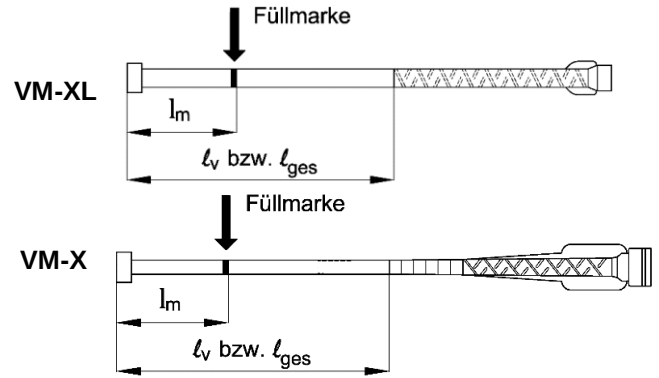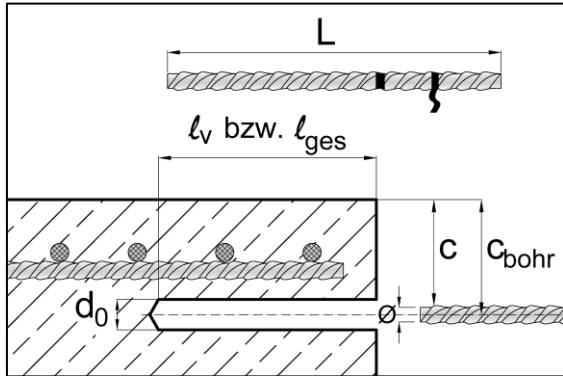

Stab	Bohrlocherstellung				Verfüllen der Bohrlöcher und Setzen der Bewehrungstäbe / Zuganker								
	Stab- Ø	Abstand von Rand-Achse	Bohr- loch-Ø	Bohr- lochtiefe	Setztiefen- markierung	Gesamt- länge Stab	Füllmarkierung Mischer- längerung	Rückfedern des Stabes		Mörtel Überschuss vorhanden		Stab- über- stand	Beton- deckung
	Ø	C _{bohr}	d ₀	l _v bzw. l _{ges}	l _v bzw. l _{ges}	L	l _m	ja	nein	ja	nein	[mm]	c
Nr.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					[mm]	[mm]

Bemerkungen:

Die ordnungsgemäße Ausführung nach der Bewertung ETA-11/0514 wird hiermit bestätigt:

Ort, Datum _____

Unterschrift Monteur _____

Unterschrift Bauleiter _____
