

MONTAGEPROTOKOLL

Nachträglicher Bewehrungsanschluss mit Injektionssystem VMH (ETA-17/0715)

Freie Felder müssen vollständig ausgefüllt und ☒ angekreuzt werden!

Montageanweisung oder ETA-17/0715 Anhang B sind zu beachten!

Dieses Protokoll ist zusammen mit den Lieferscheinen nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre aufzubewahren!

Montageprotokoll Nr.: _____

Datum: _____ / _____ / _____

Anschlussort _____ Bauteilposition _____

Plan Nr. _____ Position im Bewehrungsplan _____

Bauvorhaben:

Straße / Ort _____

Bauleitung _____ Tel.: _____ Fax: _____

Ausführende Firma:

Straße / Ort _____

Ansprechpartner _____ Tel.: _____ Fax: _____

Vorhandener Beton:

C _____ / _____ (B _____)

Vorhandene Bewehrung: ☐ Überprüfung der Lage

Stabdurchmesser _____ mm Achsabstand _____ mm

Einzubauende Bewehrung:

☐ B500B ☐ MKT Zuganker ZA ☐ _____

Anzahl der Stäbe: _____ Stück

Stabdurchmesser: $\varnothing$ = _____ mm


Betondeckung: c = _____ mm

Abstand (Bauteilrand – Stabachse): c_{bohr} = _____ mm

Bohrlochdurchmesser: d_0 = _____ mm

Setztiefe: l_v bzw. l_{ges} = _____ cm

Bohrrichtung: ☐ $\Rightarrow$ ☐ $\Downarrow$ ☐ $\Uparrow$ ☐ $\nearrow$ ☐ $\searrow$

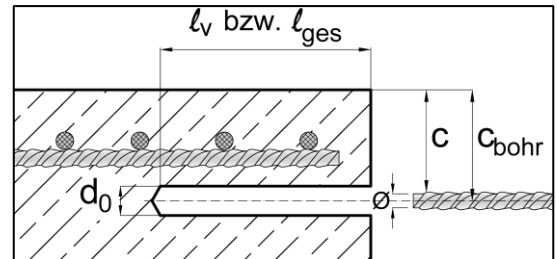

Bohrlocherstellung: ☐ Elektro-Bohrhammer ☐ Pressluft-Bohrhammer ☐ Saugbohrer (keine Reinigung)

☐ Erstellung des Bohrlochs mit Bohrhilfe

Vorbereiten der Anschlussfuge: ☐ nach Vorgabe der Ausführungsplanung

Bohrlochreinigung bis zum Bohrlochgrund

Kompressortyp: _____ Leistung _____ m³/h _____ l/min

Bohrlochzustand: ☐ trocken ☐ feucht

☐ Ausblaspistole: ☐ VM-ABP 200 ☐ VM-ABP 250 ☐ VM-ABP 500 ☐ VM-ABP 1000

oder

☐ Druckluftsystem DLS und Schlauch RS _____

oder

☐ Ausblaspumpe VM-AP 360

Ausblaspistole oder Druckluftsystem:

☐ 2x Ausblasen

☐ 2x Ausbürsten mit Reinigungsbürste RB _____ ☐ Min. Bürstendurchmesser beachtet

☐ 2x Ausblasen

oder

Ausblaspumpe:

☐ 4x Ausblasen

☐ 4x Ausbürsten mit Reinigungsbürste RB _____ ☐ Min. Bürstendurchmesser beachtet

☐ 4x Ausblasen

MONTAGEPROTOKOLL

VMH Kartuschen:

☐ 280 ml ☐ 345 ml ☐ 420 ml ☐ 825 ml

☐ Statikmischer VM-XHP ☐ Mischerverlängerung VM-XE 10 ☐ Mischerverlängerung VM-XLE 16

☐ Injektionsadapter VM-IA: _____ (Bohrloch- Ø)

Auspressgerät - Größe: ☐ VM-P 380

☐ VM-P 585 ☐ VM-P 1400

Auspressgerät - Typ: ☐ VM-P Standard

❑ VM-P Profi

☐ VM-P Akku

☐ VM-P Akku ☐ VM-P Pneumatik

Temperatur: Luft: _____ °C Beton: _____ °C Kartusche: _____ °C Einbau: _____ : _____ Uhr




Max. Installationsmoment T_{inst} :

□ M12 - 50 Nm

☐ M20 - 150 Nm

☐ M16 - 100 Nm

☐ M24 - 150 Nm

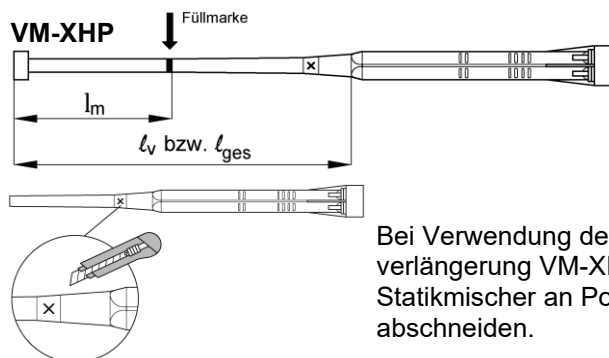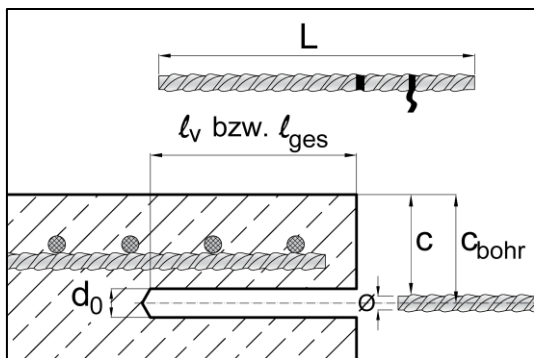

Bei Verwendung der Mischer-
verlängerung VM-XE 16 den
Statikmischer an Position „X“
abschneiden.

[illegible]

Die ordnungsgemäße Ausführung nach der Bewertung ETA-17/0715 wird hiermit bestätigt:

Ort. Datum

Unterschrift Monteur

Unterschrift Bauleiter
